
Басейнова дирекция "Черноморски район"

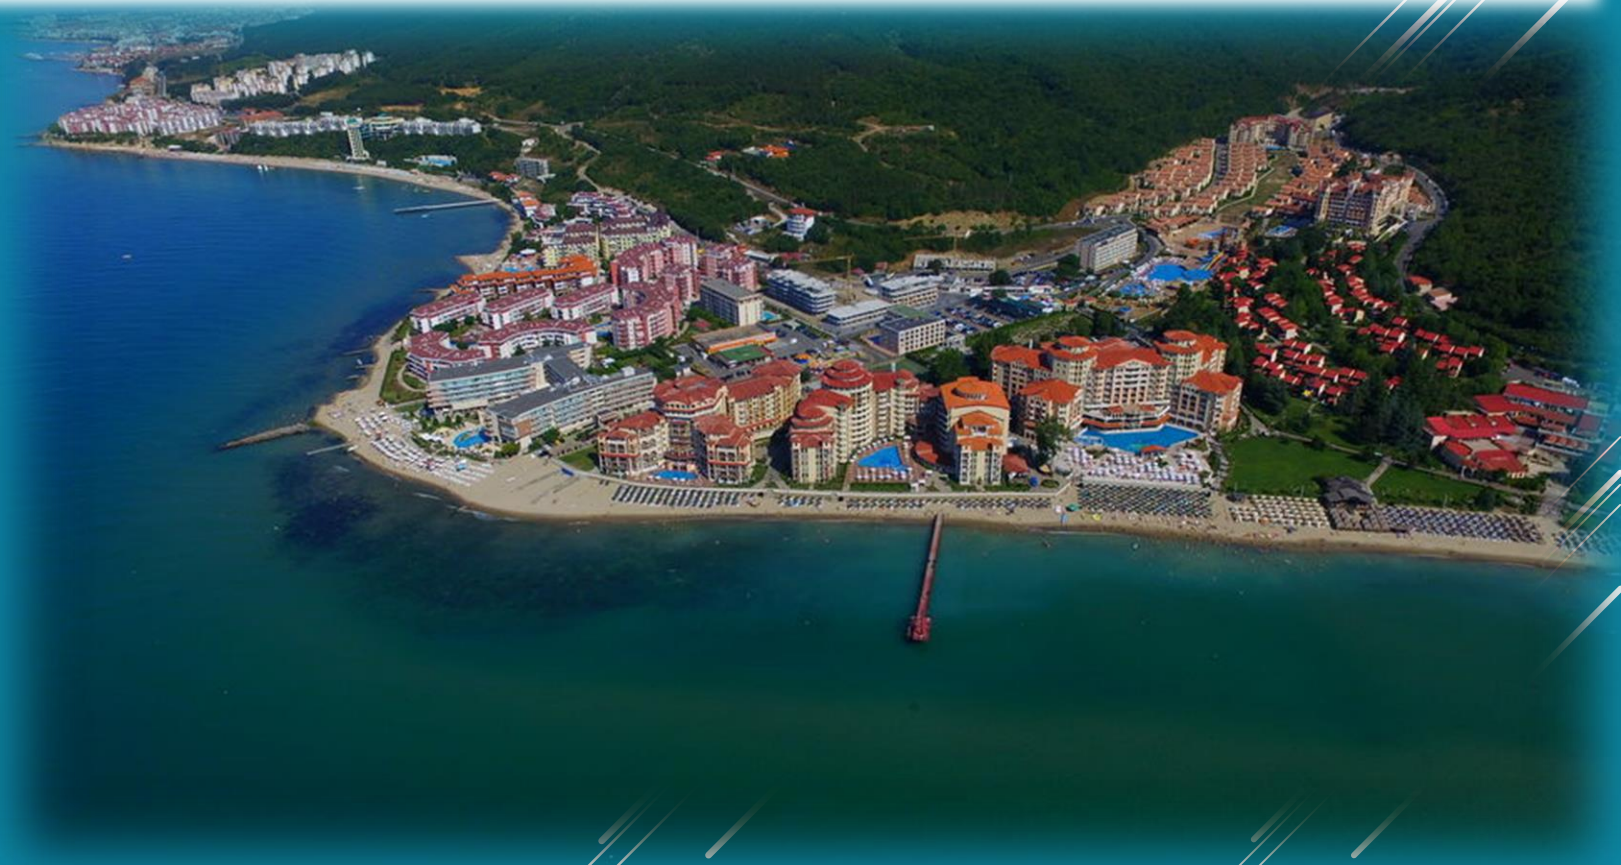

НАВОДНЕНИЯТА

ПО ЮЖНОТО ЧЕРНОМОРИЕ

03.10.2025 г.

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ

Речни русла к. с. „Елените“ и общ. Царево

Реки – „Дращела“

Дере - „Козлука“

Кратка информация за осъществената превантивна контролна дейност на речни русла на територията на общ. Царево и к. с. „Елените“ преди наводнението



Отговорни структури за възстановяване и поддържане на проводимостта на речните легла са:

- за речни легла „в“ границите на урбанизирани територии – кмет на община, на основание чл. 140, ал. 4, т. 2

- за речни легла „извън“ границите на урбанизирани територии – областен управител, на основание чл. 140, ал. 5, т. 2


- По Заповеди на Областен управител на област Бургас в периода 01. януари 2024 г. – 30 юни 2025 г. на територията на Община Несебър и Община Царево са проверени общо 33 бр. речни участъци, в т.ч.:
- През пролетта на 2024 г. са проверени 3 бр. речни участъка на територията на общ. Несебър, с издадени 3 бр. предпиания за осигуряване на нормална провидмост, от които 2 бр. са изпълнени и съставен 1 бр. АУАН на Кмета на общ. Несебър за неизпълнение на предписание за осугуряване на нормална проводимост.
- Проверени са 16 бр. речни участъка на територията на община Царево, с издадени 16 бр. предпиания за осигуряване на нормална провидмост, от които 9 бр. са изпълнени и 3 бр. частично изпълнени.
- През есента на 2024 г. са извършени последващи проверка по изпълнение на издадените през пролетните проверки предписания на територията на общ. Царево, при които са установени, че същите са изпълнени. Допълнително са извършени проверки на 6 бр. речни участъка, при които са установени, че 1 бр. участък е с нарушена проводимост, за което е издадено предписание за осигуряване на нормална проводимост.
- През пролетта на 2025 г. е извършена проверка на 1 бр. участък на територията на общ. Царево, при която е установено, че е с нарушена продимост и издадено предписание, което е изпълнено в срока.

СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № РД-735 ОТ 15.10.2025 Г. НА МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ СА ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ ОТ КОМИСИЯ ОТ ЕКСПЕРТИ НА БДЧР И РИОСВ.

Царево и Лозенец


Попадащи в Район със значим потенциален риск от наводнения в ПУРН 2022-2027 г. „Черно море – гр. Царево“ с код BG2_APSFR_BS_10



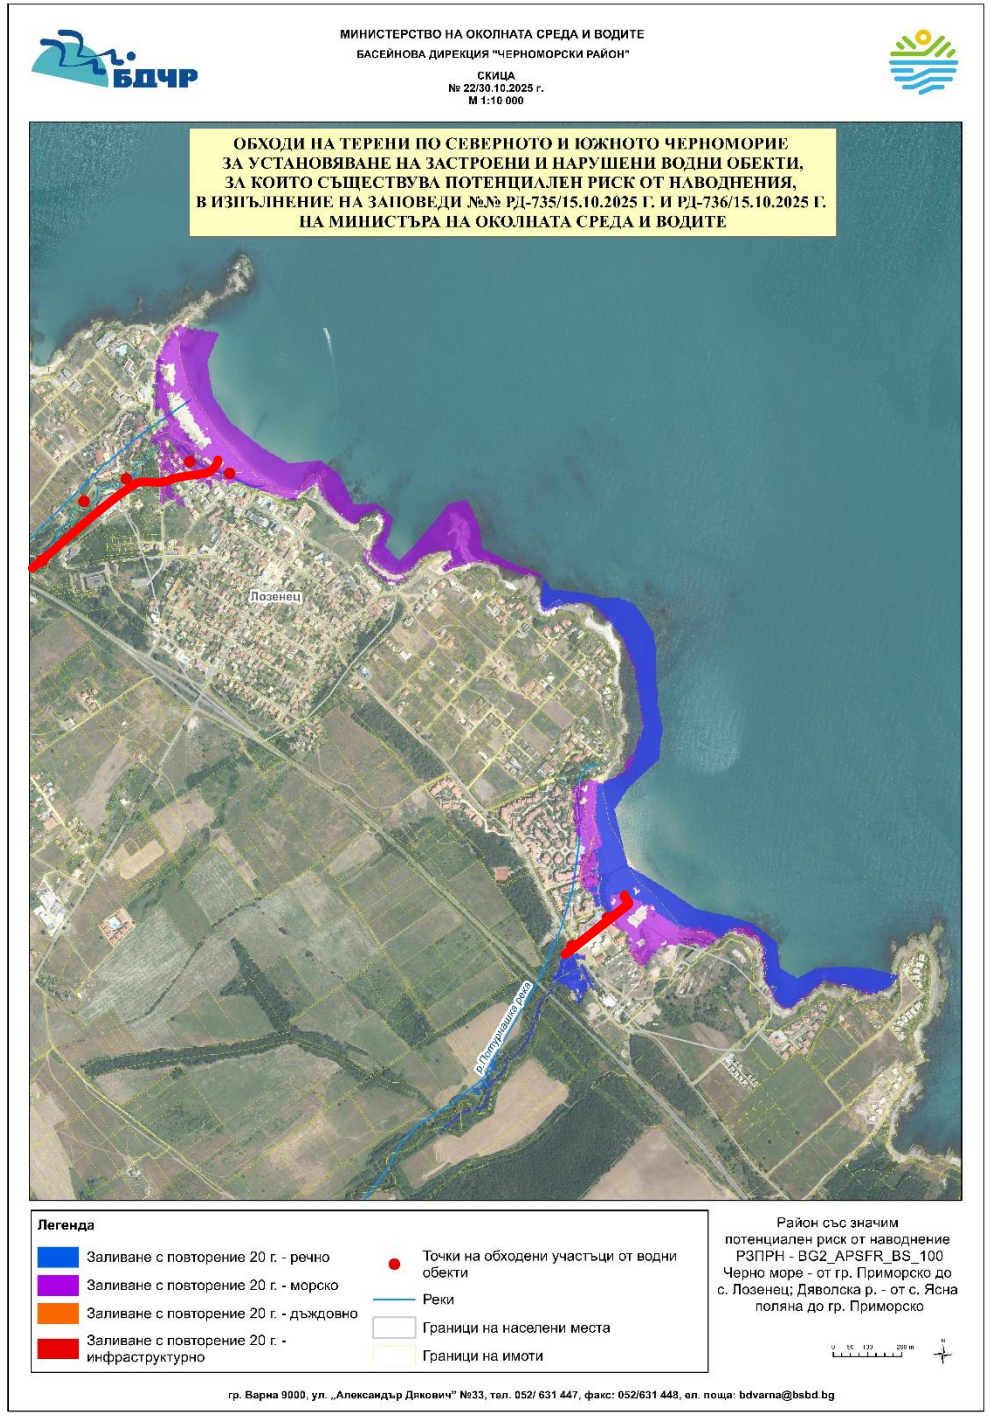

Китен и Созопол


Попадащи в Район със значим потенциален риск от наводнения в ПУРН 2022-2027 г. „Черно море – от гр. Приморско до с. Лозенец“ с код BG2_APSFR_BS_100 и „Черно море – от гр. Черноморец до гр. Созопол“ с код BG2_APSFR_BS_08

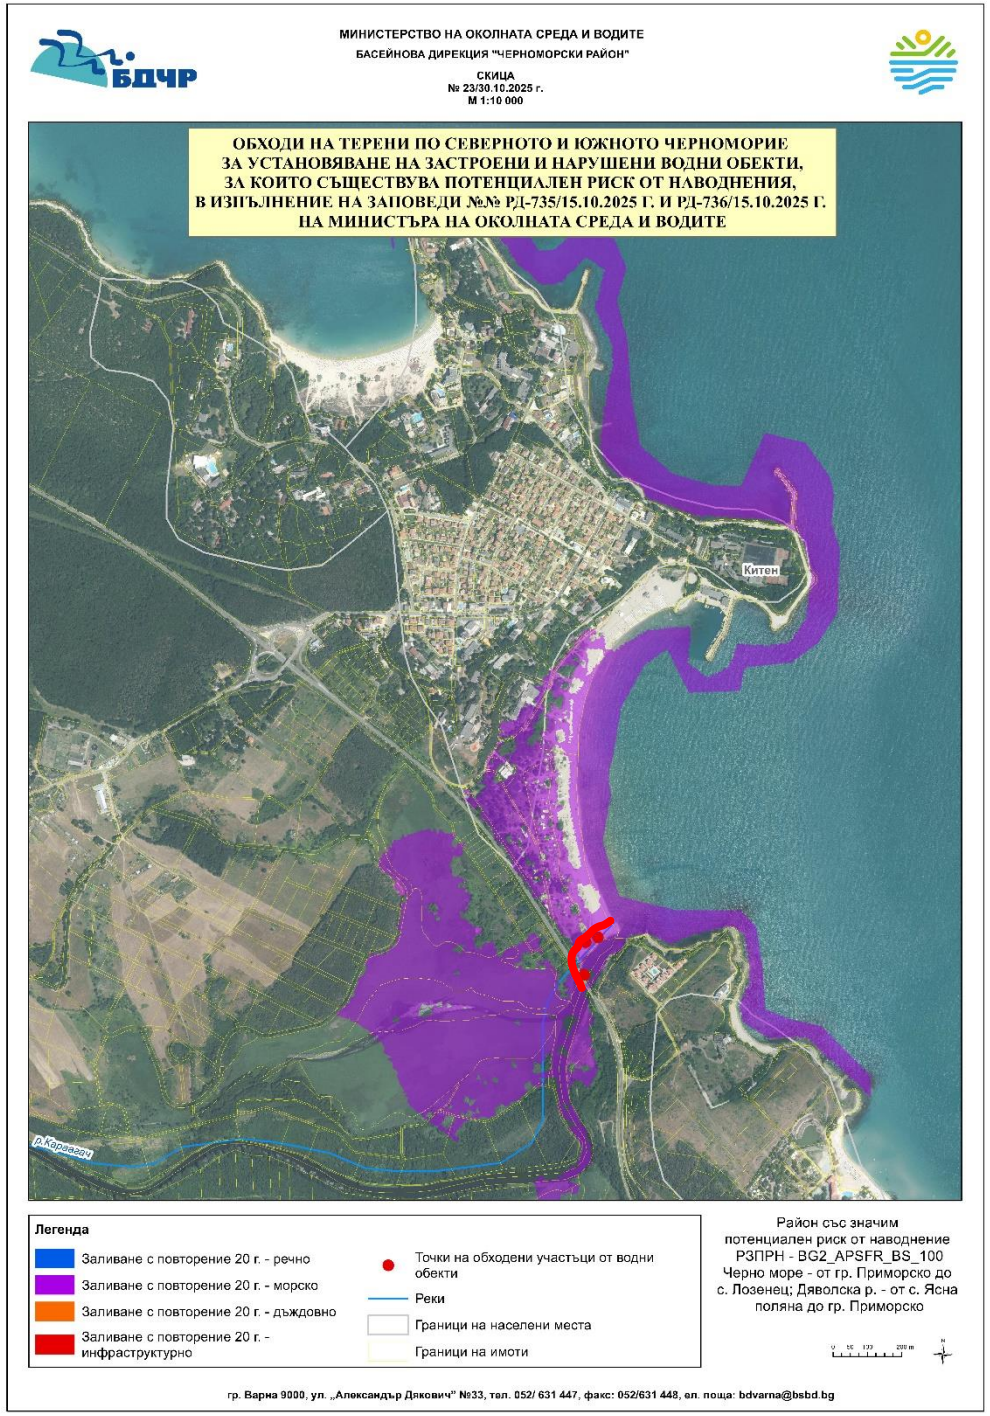




Черноморец и Ахелой


Попадащи в Район със значим потенциален риск от наводнения в ПУРН 2022-2027 г. „Черно море – от гр. Черноморец до гр. Созопол“ с код BG2_APSFR_BS_08 и „Черно море – от гр. Свети Влас до гр. Поморие“ с код BG2_APSFR_BS_06

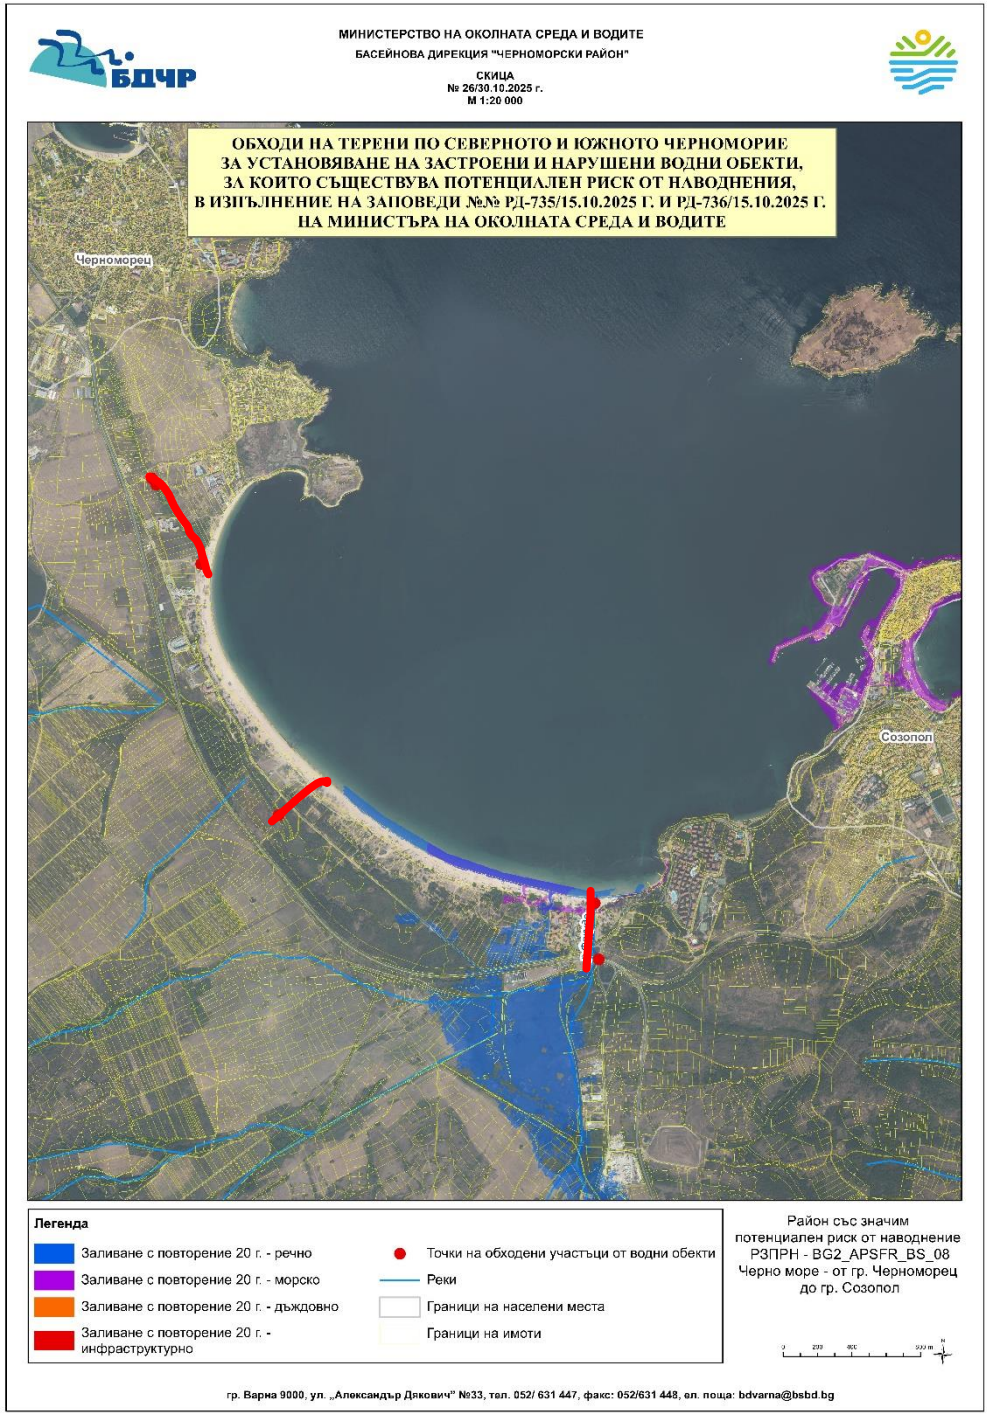


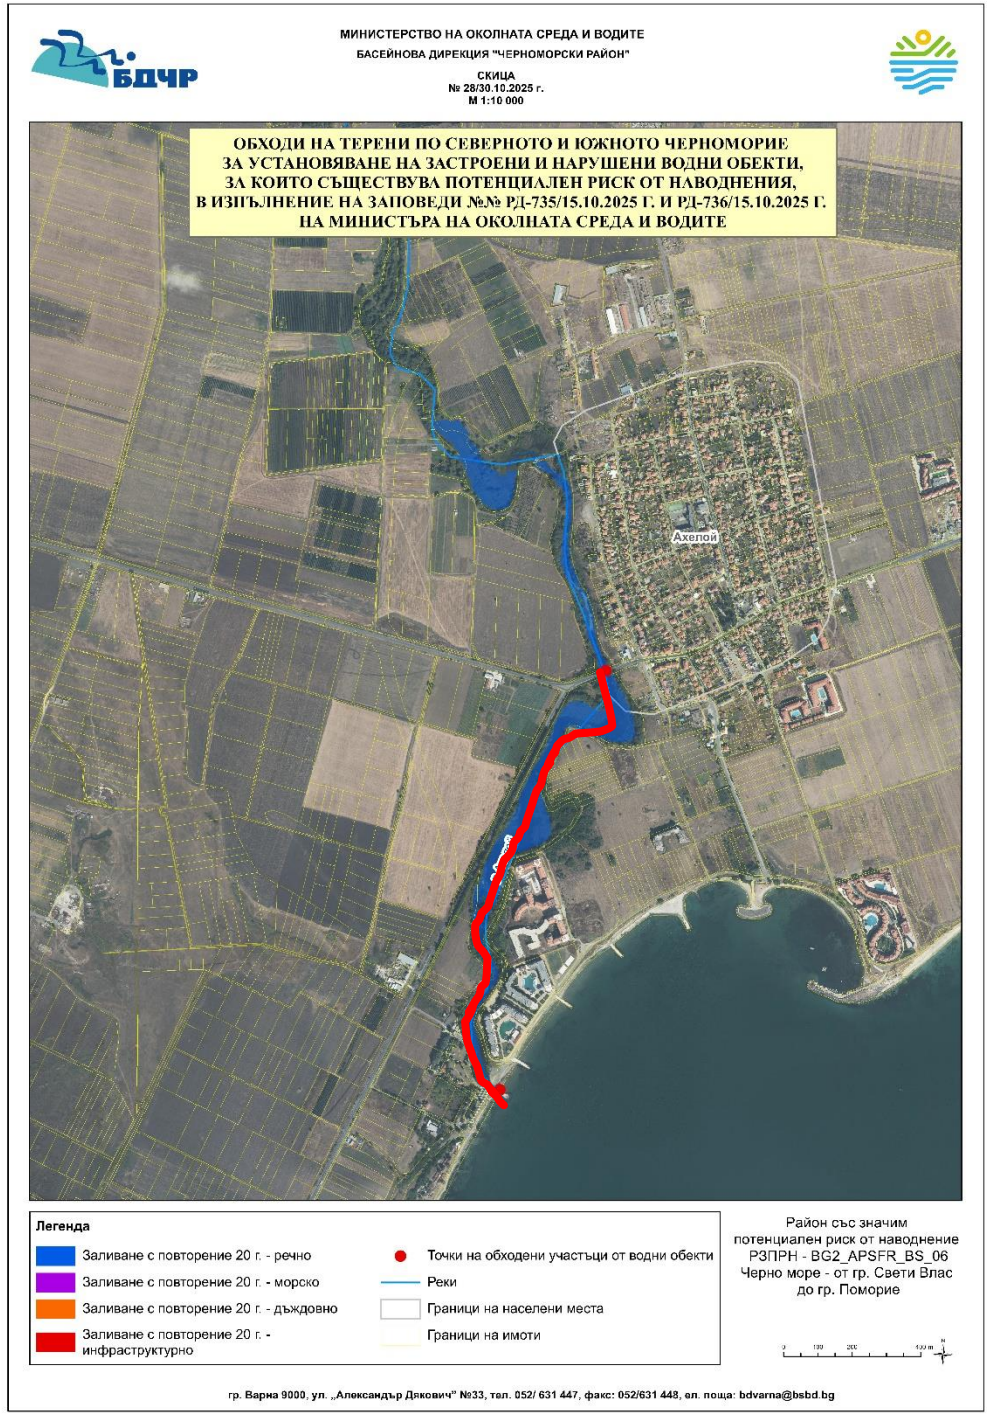

Слънчев бряг и Свети Влас

Попадащи в Район със значим потенциален риск от наводнения в ПУРН 2022-2027 г. „Черно море – от гр. Свети Влас до гр. Поморие“ с код BG2_APSFR_BS_06

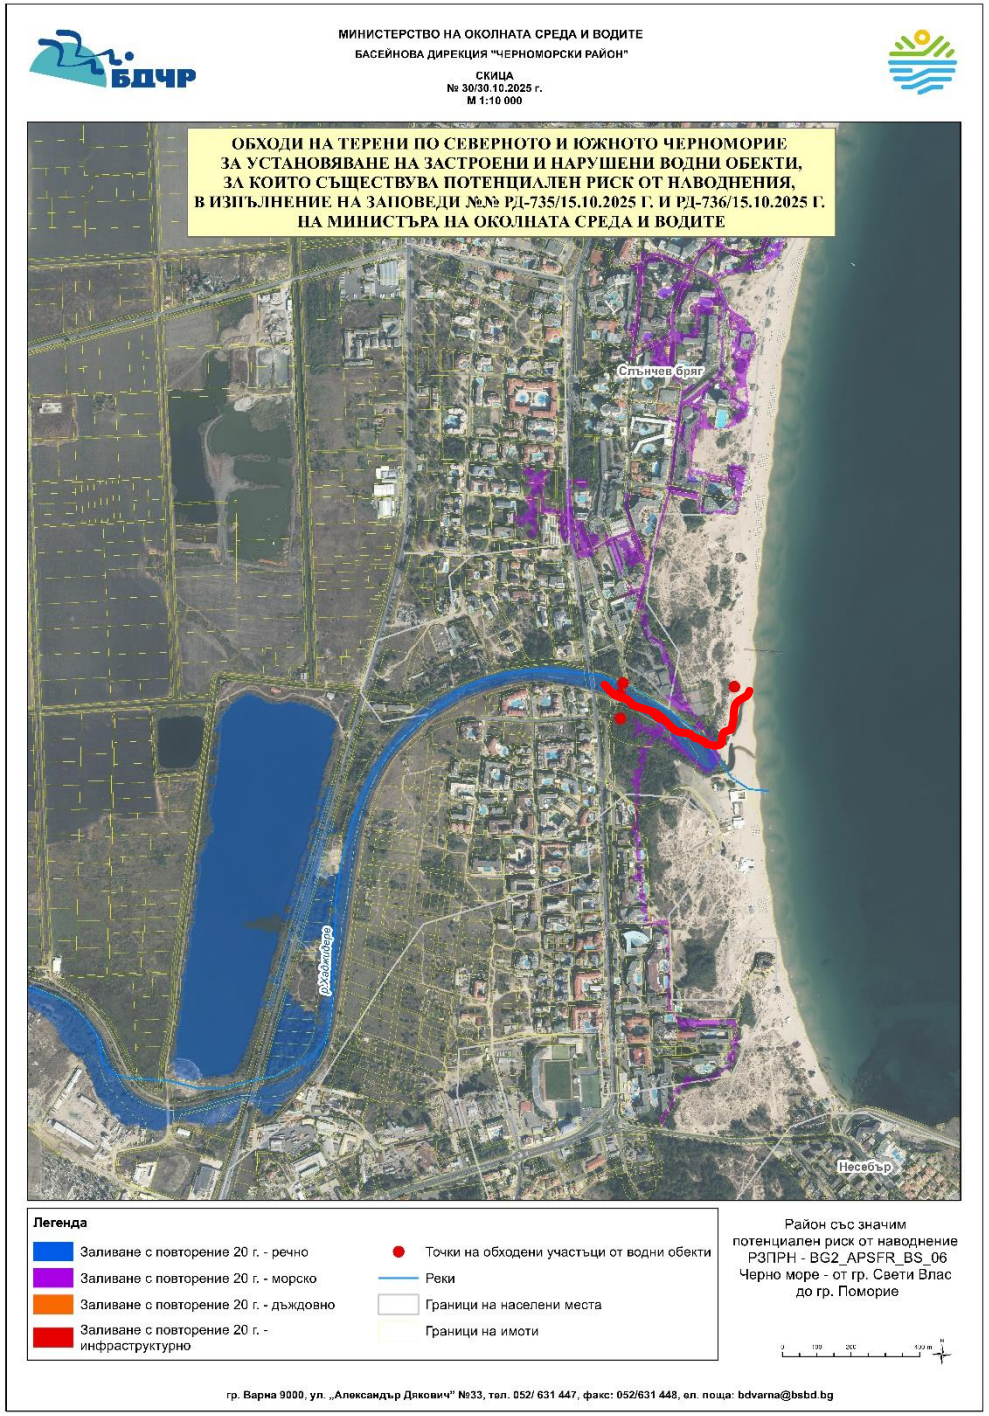

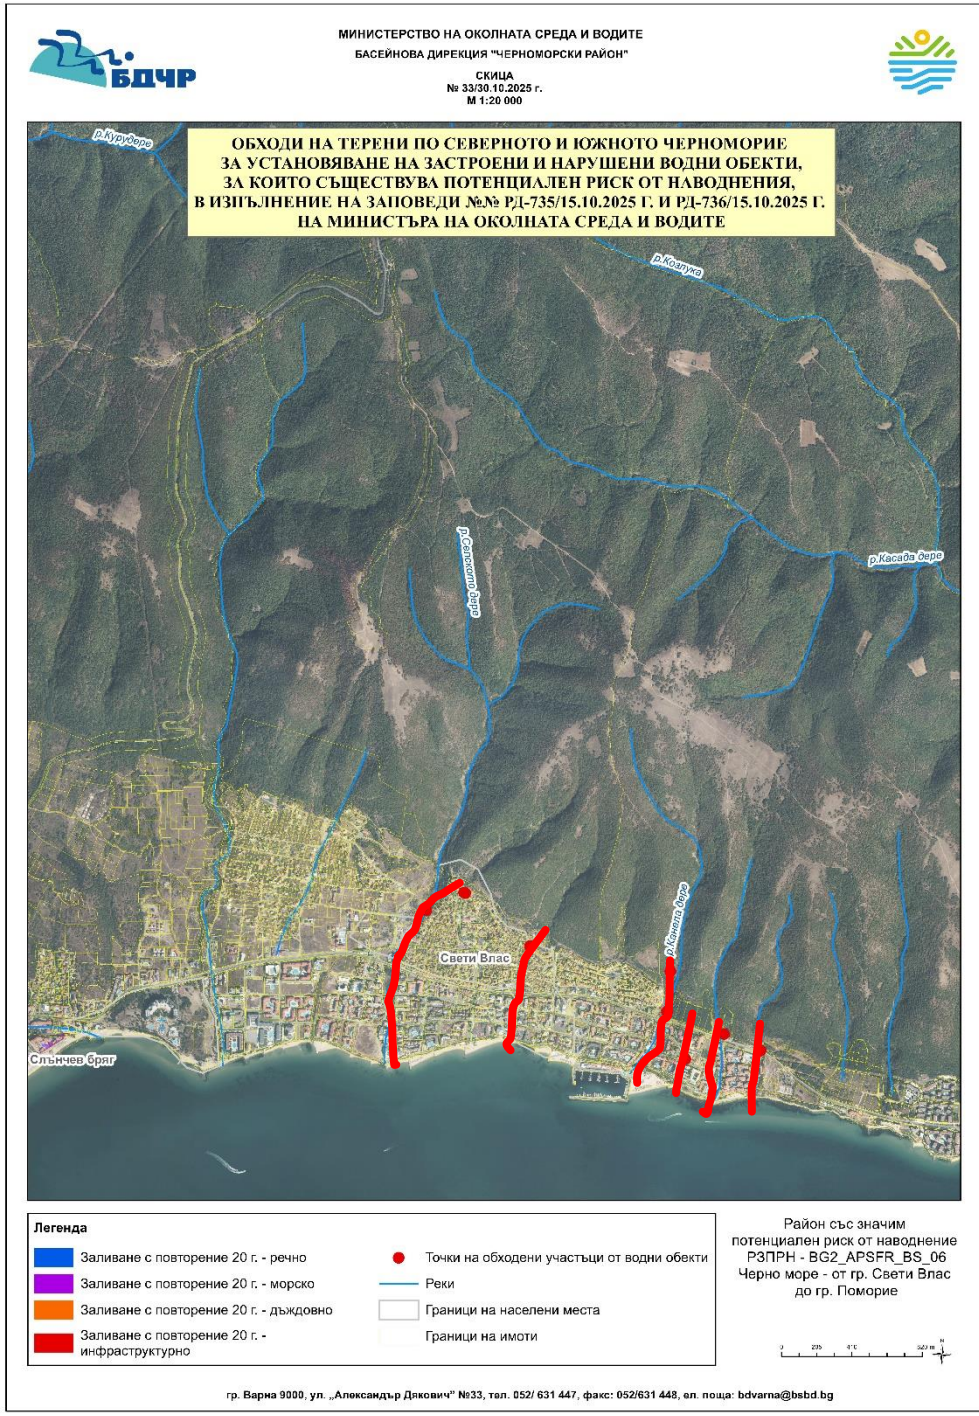


к.к Елените

Попадащ в Район със значим потенциален риск от наводнения в ПУРН 2022-2027 г. „Черно море – от гр. Свети Влас до гр. Поморие“ с код BG2_APSFR_BS_06



НАВОДНЕНИЕ – К. С. „ЕЛЕНИТЕ“ 03.10.2025 Г.

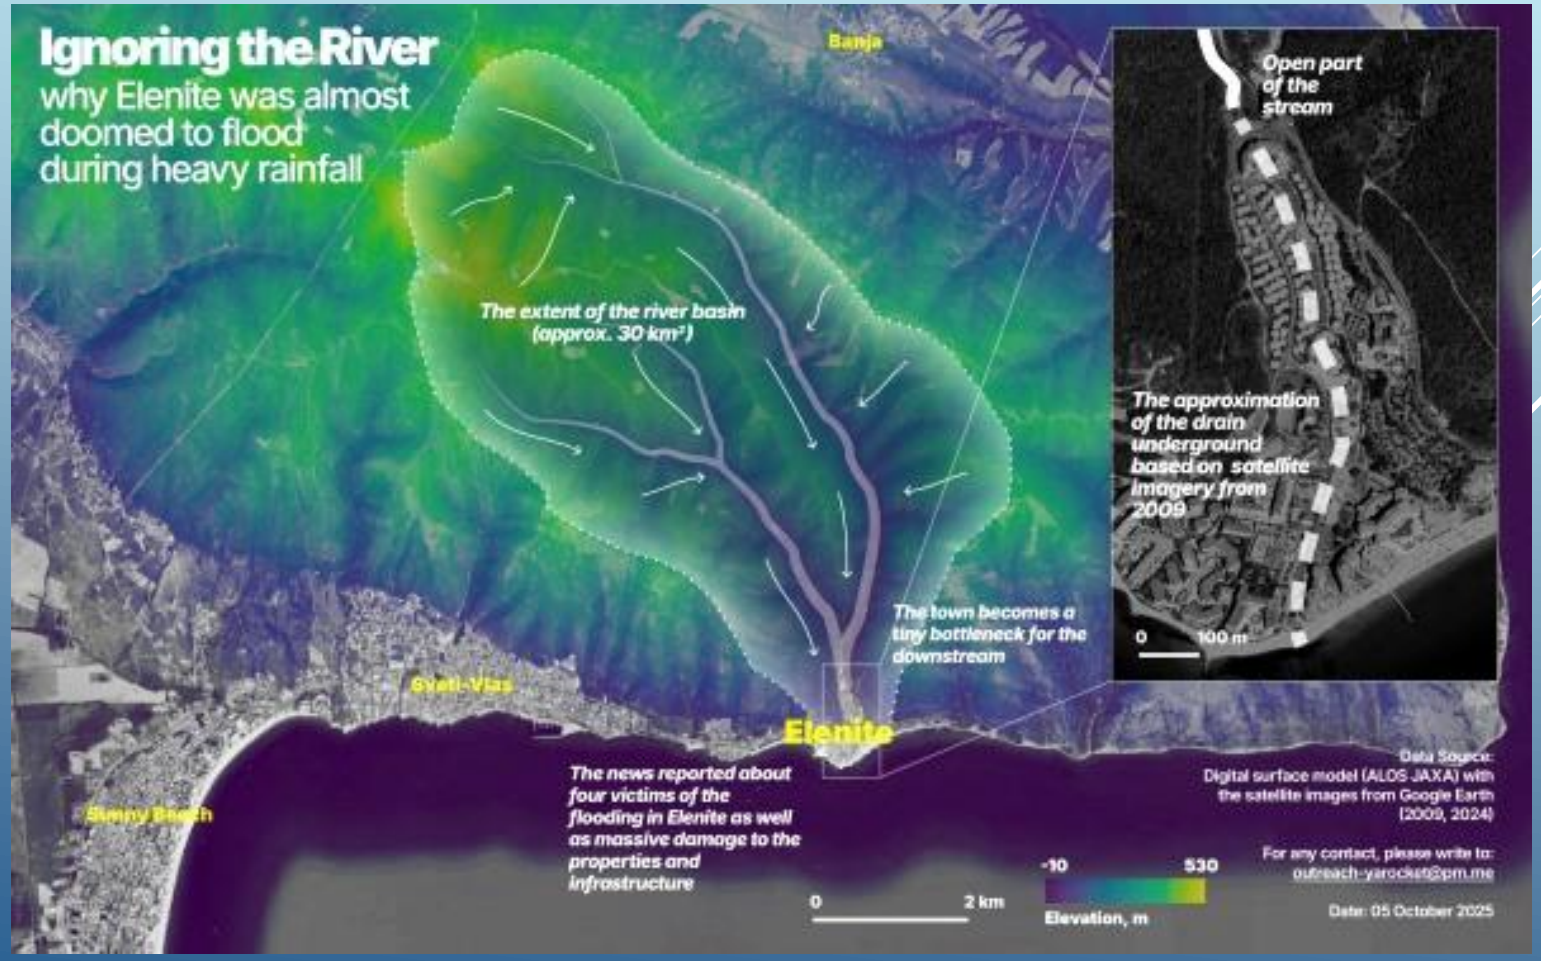

Река „Козлука“ принадлежи към поречие – старопланински реки, която изтича от извор до вр. „Карнанлък (455,9м). Протича на югоизток през дълбока долина и образува разклонена речна мрежа в югоизточния склон на Еминска планина. Реката се влива в Черно море при курорта Елените, източно от гр. Свети влас. Река „Дращела“ е ляв приток на р. „Козлука“, който се влива в последнта преди вавлизането и в в.с. „Елените“.

Съобразно провеждания от 2013 г. до момента мониторинг за физикохимично състояние в пункт „Дращела“ устие BG2SE00541MS232, през годините се откроява ясна тенденция за пресъхване на реката в летните месеци на годината.



Проверен е речен участък от **река Козлука / Дращела при мост преди покрит участък** в начална точка с географски координати N 42º 42` 35,81`` E 27 º 48` 32,11`, дължина на обходения участък около 500 м. нагоре срещу Началото на обходения участък съвпада с начало на коригиран участък на река Козлука, в границите на в. с. „Елените“ в близост до сграда „Общежитие“ и в мястото на преминаване на реката в коригиран покрит участък. В отвора на моста след около 7,00 м. светлия отвор е видим около 1,5 м. височина и речното легло е значително по стеснено. Наблюдават се множество подприщвания около моста от дървета, клони и много битови отпадъци.



При обхода на левия бряг по течението на река Козлука/ Дращела N 42° 42′ 42,4″ E 27° 48′ 31,2″ се установява формиран насип, с височина около 20-25 м., който попада в речното корито. Същият е запръстен, към момента обрасъл с тревна, храстовидна и дървесна растителност. В резултат на високите води страничните откоси на насипа са свлечени, като се констатират следи от натрупани строителни и битови отпадъци по насипа. Депонираните земни маси, строителни и битови отпадъци са приблизително 100 000 кв. м.



Проверен чрез обход е покрит /коригиран/ речен участък от река Козлука / Дращела геогр. координати N 42° 42` 35,81`` E 27° 48` 32,11`` мост след който коритото на реката навлиза в коригиран покрит участък. Покритият участък от реката преминава под закрито стоманобетоново съоръжение, представляващо 2 броя П- образни бетонови профила, кахони тип тунел с правоъгълно сечение. Крайната точка на покритата част на корекцията е при заустване в Черно море. N 42° 42′ 05,2848″ E 27° 48′ 34,0776″. Дължината на коригираната (покрита) част от реката е около 1000 м. При начало на покрит коригиран участък с се наблюдават разрушена и изместена покривна конструкция, пътни настилки, подземни комуникации.



По цялата територия на в. с. Елените се наблюдават обилни количества наноси, довлечени от високите води при наводнението - дървесни материали, клони, цели изкоренени дървета, корени, дънери и др. В границите на селището се наблюдават изхвърлени различни битови уреди и други битови отпадъци от жилищните сгради. Алейната мрежа, басейните и зелените площи са покрити с обилни количества довлечена кал и наноси.



Електрозахранването на селището е прекъснато, поради наводняване на наличните трансформаторни постове за захранване. Компрометирани и частично разрушени и прекъснати са площадковите ВиК мрежи на територията на селището. В момента на проверката, на територията на селището се извършват дейности по почистване със специализирана техника на наноси, кал и др. отпадъци



Съгласно ПУРН за Черноморски район 2022 – 2027 г., районът на гр. Св. Влас, включително река Козлука/Дращела попада в определен район със значителен потенциален риск от наводнения, „Черно море от гр. Свети Влас до гр. Поморие. Предвид утвърдената програма от мерки към ПУРН 2022 – 2027 г. са предвидени мерки на национално ниво и на ниво район за басейново управление.



НАВОДНЕНИЕ - общ.
ЦАРЕВО
03.10.2025

НЕКОРИГИРАН УЧАСТЪК ОТ РЕКА ЧЕРНА, ПРЕМИНАВАЩА ПРЕЗ УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ НА ГР. ЦАРЕВО

Проверявания речен участък попада в определен район със значителен потенциален риск от наводнения, съгласно ПУРН за Черноморски район 2022 – 2027 г. с код BG2_APSER_BS_10 и наименование „Черно море – гр. Царево“ и се залива при трите моделирани сценарии с периоди на повторяемост 20, 100 или 1000 години за дъждовни поройни наводнения. Речният участък, от река Черна, обект на проверката е без изградени диги и няма изграждани корекции.



НЕКОРИГИРАН УЧАСТЪК ОТ РЕКА ЧЕРНА, ПРЕМИНАВАЩА ПРЕЗ УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ НА ГР. ЦАРЕВО

Проверявания речен участък попада в определен район със значителен потенциален риск от наводнения, съгласно ПУРН за Черноморски район 2022 – 2027 г. с код BG2_APSER_BS_10 и наименование „Черно море – гр. Царево“ и се залива при трите моделирани сценарии с периоди на повторяемост 20, 100 или 1000 години за дъждовни поройни наводнения. При огледа на двата бряга на обследвания участък от реката се наблюдава изнесена от речното корито изкоренена дървесна маса.



НЕКОРИГИРАН УЧАСТЪК ОТ РЕКА ЛИСОВО ДЕРЕ /ИЗГРЕВСКО ДЕРЕ/, ПРИ С. ИЗГРЕВ, ОБЩ. ЦАРЕВО

Мостовото съоръжение е напълно разрушено след преминалите високи води на 03.10.2025 г. Високите води при настъпилото наводнение са прехвърлили моста. Същият е с малък светъл отвор, с неподходяща конструкция /старо съоръжение/. Пътя за М. Търново е затворен, поставени са табели, забраняващи преминаването. в двете посоки. Към дата на извършване на проверката река Лисово дере в този участък е пълноводна и свободно провежда преминаващите водни количества.



ПРОВЕРКА НА ПСОВ ЦАРЕВО

По данни на ръководител на ПСОВ –Царево, в резултат на продължителни интензивни валежи от дъжд, считано от 03.10.2025 г. ПСОВ е в авариен режим на работа поради наводнение на всички пречиствателни съоръжения, прекъснато основно и аварийно ел. захранване на пречиствателните съоръжения. По данни на присъствалия представител на ВиК дружеството се очаква оценка на щетите и набелязване на последващите действия и срокове за поетапно въвеждане на ПСОВ в нормален технологичен режим. От оперативния персонал на ПСОВ в момента на проверката се извършват дейности по почистване и отводняване на помещенията, площадката и вътрешните пътища. С помощта на специализирана техника продължава отводняване на наводнени помещения в сградите.

ПРОВЕРЕН Е НЕКОРИГИРАН УЧАСТЪК ОТ ДЕРЕ, СЛЕД ДЕРЕ 500 М. ОТ ЯЗ. СТЕНА НА ЯЗОВИР “ХАДЖИ ЯНЕ”

Обща дължина на участъка приблизително около 200 м. При наводнението водата е преминала моста и е заляла прилежащите терени наоколо – бетонов възел на “Диана бетон“ ООД. Речният участък, обект на проверката е без изградени диги и няма изграждани корекции. При огледа на двата бряга на обследвания участък от реката се наблюдава изнесена от речното корито изкоренена дървесна маса. Моста не е засегнат от водната стихия. Към дата на извършване на проверката дерето свободно провежда преминаващите водни количества.



ПРОВЕРЕН Е НЕКОРИГИРАН УЧАСТЪК ОТ ДЕРЕ, МОСТ ПРЕДИ КЪМПИНГ „АРАПЯ”, ГР. ЦАРЕВО, ОБЩ. ЦАРЕВО

По двата бряга и в речното легло от мост срещу течението има наличие на суха дървесна маса от високите води. При огледа се констатира, че мост на старият път Царево-Лозенец с географски координати N 42˚11'04,2612" E 27˚49'58,0404" е бил залят от придошлите води. Нивото на водата е достигало около 1,50м над моста, металните му парапети са отнесени от водната стихия. Моста е засегнат сериозно от наводнението.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО

44 редовно заседание на Басейновия Съвет към БДЧР

04.11.2025 г.
